YZERON - Requalification du centre-bourg

EUROVIA
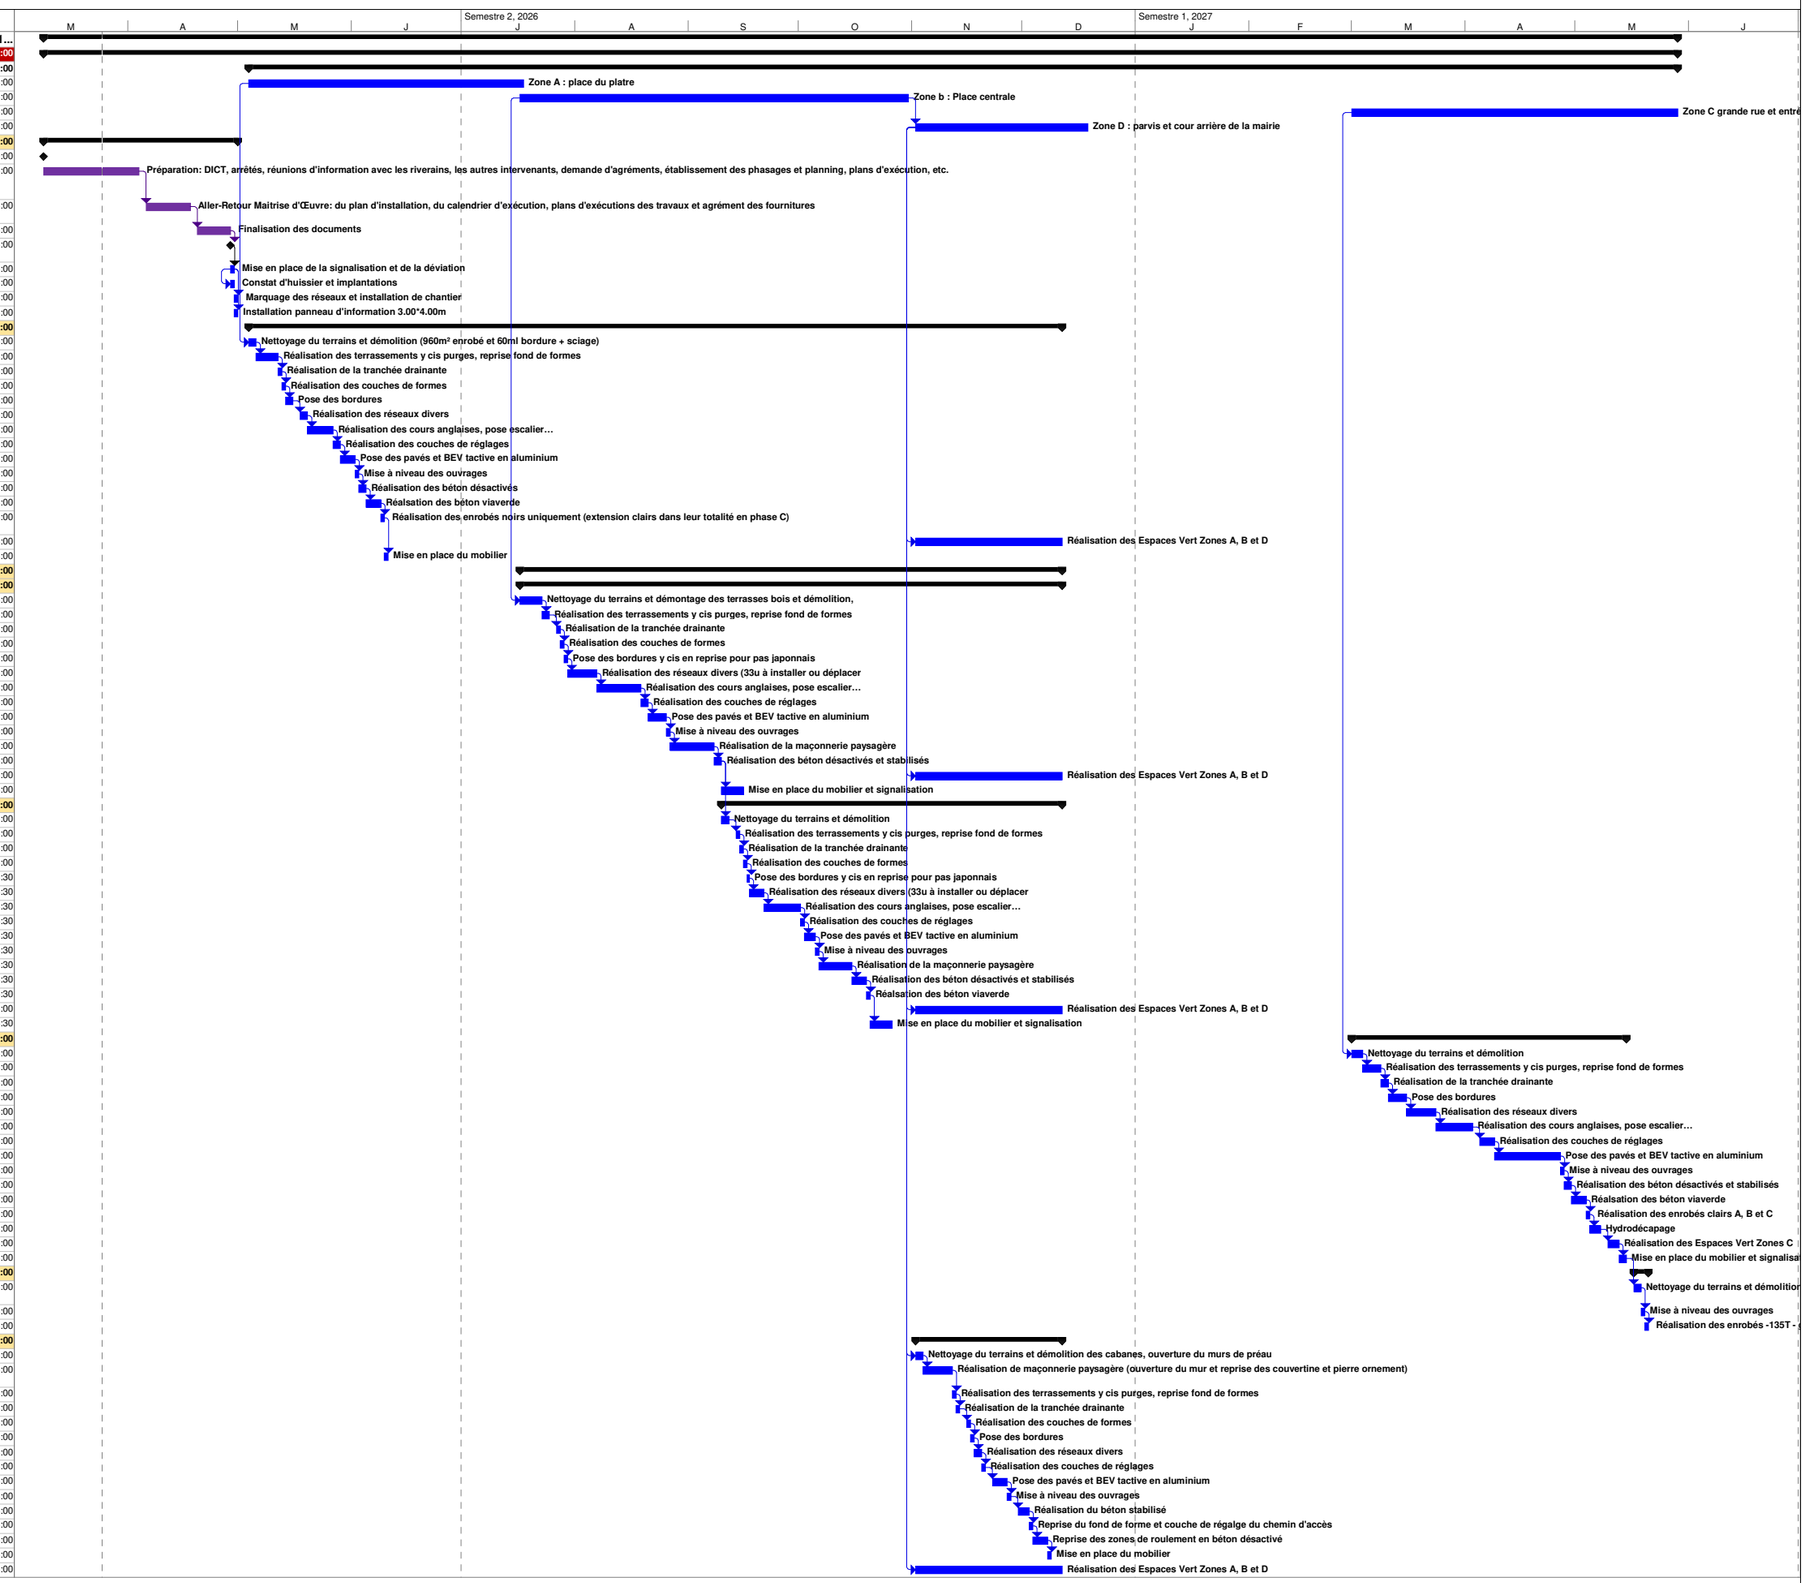
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**YZERON - Requalification du centre bourg**	**320 jrs**	**09/03/26 0...**	**28/05/27 1...**
2	**Planning prévisionnel**	**320 jrs**	**09/03/26 09:00**	**28/05/27 18:00**
3	**Durée prévisionnel du marché**	**280 jrs**	**04/05/26 09:00**	**28/05/27 18:00**
4	Zone A : place du platre	55 jrs	04/05/26 09:00	17/07/26 18:00
5	Zone b : Place centrale	76 jrs	17/07/26 09:00	30/10/26 18:00
6	Zone C grande rue et entrées cetnre bourg	65 jrs	01/03/27 09:00	28/05/27 18:00
7	Zone D : parvis et cour arrière de la mairie	35 jrs	02/11/26 09:00	18/12/26 18:00
8	**Préparation de chantier**	**39 jrs**	**09/03/26 09:00**	**30/04/26 18:00**
9	Os de Notification démarrage de la préparation de chantier	0 jr	09/03/26 09:00	09/03/26 09:00
10	Préparation: DICT, arrêtés, réunions d'information avec les riverains, les autres intervenants, demande d'agréments, établissement des phasages et planning, plans d'exécution, etc.	20 jrs	09/03/26 09:00	03/04/26 18:00
11	Aller-Retour Maitrise d'Œuvre: du plan d'installation, du calendrier d'exécution, plans d'exécutions des travaux et agrément des fournitures	10 jrs	06/04/26 09:00	17/04/26 18:00
12	Finalisation des documents	7 jrs	20/04/26 09:00	28/04/26 18:00
13	OS de validation du plan d'installation, du calendrier d'exécution, plan d'exécution de travaux et agrément des fournitures	0 jr	28/04/26 18:00	28/04/26 18:00
14	Mise en place de la signalisation et de la déviation	1 jr	29/04/26 09:00	29/04/26 18:00
15	Constat d'huissier et implantations	1 jr	29/04/26 09:00	29/04/26 18:00
16	Marquage des réseaux et installation de chantier	1 jr	30/04/26 09:00	30/04/26 18:00
17	Installation panneau d'information 3.00*4.00m	1 jr	30/04/26 09:00	30/04/26 18:00
18	**Zone A - phase 1: Place du plâtre et de l'église**	**160 jrs**	**04/05/26 09:00**	**11/12/26 18:00**
19	Nettoyage du terrains et démolition (960m² enrobé et 60ml bordure + sciage)	2 jrs	04/05/26 09:00	05/05/26 18:00
20	Réalisation des terrassements y cis purges, reprise fond de formes	4 jrs	06/05/26 09:00	11/05/26 18:00
21	Réalisation de la tranchée drainante	1 jr	12/05/26 09:00	12/05/26 18:00
22	Réalisation des couches de formes	1 jr	13/05/26 09:00	13/05/26 18:00
23	Pose des bordures	2 jrs	14/05/26 09:00	15/05/26 18:00
24	Réalisation des réseaux divers	2 jrs	18/05/26 09:00	19/05/26 18:00
25	Réalisation des cours anglaises, pose escalier…	5 jrs	20/05/26 09:00	26/05/26 18:00
26	Réalisation des couches de réglages	2 jrs	27/05/26 09:00	28/05/26 18:00
27	Pose des pavés et BEV tactive en aluminium	2 jrs	29/05/26 09:00	01/06/26 18:00
28	Mise à niveau des ouvrages	1 jr	02/06/26 09:00	02/06/26 18:00
29	Réalisation des béton désactivés	2 jrs	03/06/26 09:00	04/06/26 18:00
30	Réalsation des béton viaverde	2 jrs	05/06/26 09:00	08/06/26 18:00
31	Réalisation des enrobés noirs uniquement (extension clairs dans leur totalité en phase C)	1 jr	09/06/26 09:00	09/06/26 18:00
32	Réalisation des Espaces Vert Zones A, B et D	30 jrs	02/11/26 09:00	11/12/26 18:00
33	Mise en place du mobilier	1 jr	10/06/26 09:00	10/06/26 18:00
34	**Zone B : Place centrale**	**106 jrs**	**17/07/26 09:00**	**11/12/26 18:00**
35	**Zone B - phase 2A - Place centrale NORD**	**106 jrs**	**17/07/26 09:00**	**11/12/26 18:00**
36	Nettoyage du terrains et démontage des terrasses bois et démolition,	4 jrs	17/07/26 09:00	22/07/26 18:00
37	Réalisation des terrassements y cis purges, reprise fond de formes	2 jrs	23/07/26 09:00	24/07/26 18:00
38	Réalisation de la tranchée drainante	1 jr	27/07/26 09:00	27/07/26 18:00
39	Réalisation des couches de formes	1 jr	28/07/26 09:00	28/07/26 18:00
40	Pose des bordures y cis en reprise pour pas japonnais	1 jr	29/07/26 09:00	29/07/26 18:00
41	Réalisation des réseaux divers (33u à installer ou déplacer	6 jrs	30/07/26 09:00	06/08/26 18:00
42	Réalisation des cours anglaises, pose escalier…	8 jrs	07/08/26 09:00	18/08/26 18:00
43	Réalisation des couches de réglages	2 jrs	19/08/26 09:00	20/08/26 18:00
44	Pose des pavés et BEV tactive en aluminium	3 jrs	21/08/26 09:00	25/08/26 18:00
45	Mise à niveau des ouvrages	1 jr	26/08/26 09:00	26/08/26 18:00
46	Réalisation de la maçonnerie paysagère	8 jrs	27/08/26 09:00	07/09/26 18:00
47	Réalisation des béton désactivés et stabilisés	2 jrs	08/09/26 09:00	09/09/26 18:00
48	Réalisation des Espaces Vert Zones A, B et D	30 jrs	02/11/26 09:00	11/12/26 18:00
49	Mise en place du mobilier et signalisation	4 jrs	10/09/26 09:00	15/09/26 18:00
50	**Zone B phase 2B: Place centrale SUD**	**67 jrs**	**10/09/26 09:00**	**11/12/26 18:00**
51	Nettoyage du terrains et démolition	2 jrs	10/09/26 09:00	11/09/26 18:00
52	Réalisation des terrassements y cis purges, reprise fond de formes	1 jr	14/09/26 09:00	14/09/26 18:00
53	Réalisation de la tranchée drainante	1 jr	15/09/26 09:00	15/09/26 18:00
54	Réalisation des couches de formes	1 jr	16/09/26 09:00	16/09/26 18:00
55	Pose des bordures y cis en reprise pour pas japonnais	0,5 jr	17/09/26 09:00	17/09/26 14:30
56	Réalisation des réseaux divers (33u à installer ou déplacer	2 jrs	17/09/26 14:30	21/09/26 14:30
57	Réalisation des cours anglaises, pose escalier…	8 jrs	21/09/26 14:30	01/10/26 14:30
58	Réalisation des couches de réglages	1 jr	01/10/26 14:30	02/10/26 14:30
59	Pose des pavés et BEV tactive en aluminium	1 jr	02/10/26 14:30	05/10/26 14:30
60	Mise à niveau des ouvrages	1 jr	05/10/26 14:30	06/10/26 14:30
61	Réalisation de la maçonnerie paysagère	7 jrs	06/10/26 14:30	15/10/26 14:30
62	Réalisation des béton désactivés et stabilisés	2 jrs	15/10/26 14:30	19/10/26 14:30
63	Réalsation des béton viaverde	1 jr	19/10/26 14:30	20/10/26 14:30
64	Réalisation des Espaces Vert Zones A, B et D	30 jrs	02/11/26 09:00	11/12/26 18:00
65	Mise en place du mobilier et signalisation	4 jrs	20/10/26 14:30	26/10/26 14:30
66	**Zone C : Grande rue et entrées du centre bourg - C1**	**55 jrs**	**01/03/27 09:00**	**14/05/27 18:00**
67	Nettoyage du terrains et démolition	3 jrs	01/03/27 09:00	03/03/27 18:00
68	Réalisation des terrassements y cis purges, reprise fond de formes	3 jrs	04/03/27 09:00	08/03/27 18:00
69	Réalisation de la tranchée drainante	2 jrs	09/03/27 09:00	10/03/27 18:00
70	Pose des bordures	3 jrs	11/03/27 09:00	15/03/27 18:00
71	Réalisation des réseaux divers	6 jrs	16/03/27 09:00	23/03/27 18:00
72	Réalisation des cours anglaises, pose escalier…	8 jrs	24/03/27 09:00	02/04/27 18:00
73	Réalisation des couches de réglages	4 jrs	05/04/27 09:00	08/04/27 18:00
74	Pose des pavés et BEV tactive en aluminium	12 jrs	09/04/27 09:00	26/04/27 18:00
75	Mise à niveau des ouvrages	1 jr	27/04/27 09:00	27/04/27 18:00
76	Réalisation des béton désactivés et stabilisés	2 jrs	28/04/27 09:00	29/04/27 18:00
77	Réalsation des béton viaverde	2 jrs	30/04/27 09:00	03/05/27 18:00
78	Réalisation des enrobés clairs A, B et C	1 jr	04/05/27 09:00	04/05/27 18:00
79	Hydrodécapage	3 jrs	05/05/27 09:00	07/05/27 18:00
80	Réalisation des Espaces Vert Zones C	3 jrs	10/05/27 09:00	12/05/27 18:00
81	Mise en place du mobilier et signalisation	2 jrs	13/05/27 09:00	14/05/27 18:00
82	**Zone C : Grande rue et entrées du centre bourg - C2**	**4 jrs**	**17/05/27 09:00**	**20/05/27 18:00**
83	Nettoyage du terrains et démolition _ rabotage des enrobés 900m² 1/2 chaussée pour circulation	2 jrs	17/05/27 09:00	18/05/27 18:00
84	Mise à niveau des ouvrages	1 jr	19/05/27 09:00	19/05/27 18:00
85	Réalisation des enrobés -135T - gestion demi-chaussée	1 jr	20/05/27 09:00	20/05/27 18:00
86	**Zone D : Parvis avant et cour arrière de la Mairie**	**30 jrs**	**02/11/26 09:00**	**11/12/26 18:00**
87	Nettoyage du terrains et démolition des cabanes, ouverture du murs de préau	2 jrs	02/11/26 09:00	03/11/26 18:00
88	Réalisation de maçonnerie paysagère (ouverture du mur et reprise des couvertine et pierre ornement)	6 jrs	04/11/26 09:00	11/11/26 18:00
89	Réalisation des terrassements y cis purges, reprise fond de formes	1 jr	12/11/26 09:00	12/11/26 18:00
90	Réalisation de la tranchée drainante	1 jr	13/11/26 09:00	13/11/26 18:00
91	Réalisation des couches de formes	1 jr	16/11/26 09:00	16/11/26 18:00
92	Pose des bordures	1 jr	17/11/26 09:00	17/11/26 18:00
93	Réalisation des réseaux divers	2 jrs	18/11/26 09:00	19/11/26 18:00
94	Réalisation des couches de réglages	1 jr	20/11/26 09:00	20/11/26 18:00
95	Pose des pavés et BEV tactive en aluminium	4 jrs	23/11/26 09:00	26/11/26 18:00
96	Mise à niveau des ouvrages	1 jr	27/11/26 09:00	27/11/26 18:00
97	Réalisation du béton stabilisé	3 jrs	30/11/26 09:00	02/12/26 18:00
98	Reprise du fond de forme et couche de régalge du chemin d'accès	1 jr	03/12/26 09:00	03/12/26 18:00
99	Reprise des zones de roulement en béton désactivé	2 jrs	04/12/26 09:00	07/12/26 18:00
100	Mise en place du mobilier	1 jr	08/12/26 09:00	08/12/26 18:00
101	Réalisation des Espaces Vert Zones A, B et D	30 jrs	02/11/26 09:00	11/12/26 18:00
