EUROVIA
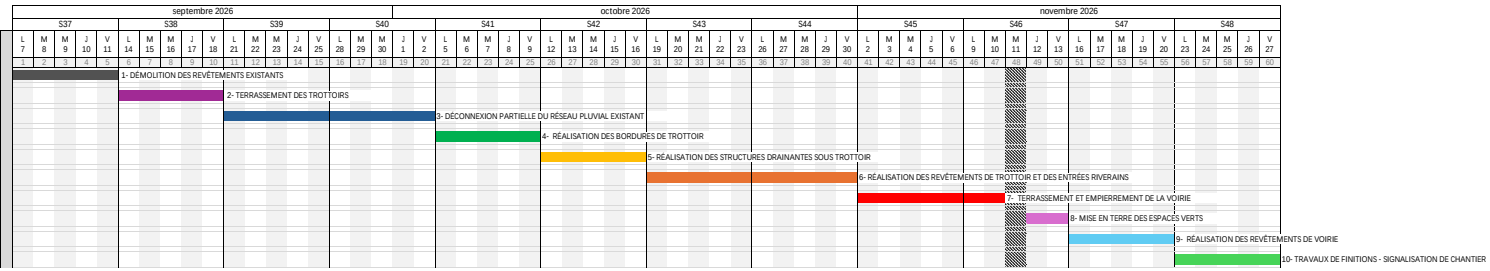
Tâches	Durée
1- DÉMOLITION DES REVÊTEMENTS EXISTANTS	5
2- TERRASSEMENT DES TROTTOIRS	5
3- DÉCONNEXION PARTIELLE DU RÉSEAU PLUVIAL EXISTANT	10
4- RÉALISATION DES BORDURES DE TROTTOIR	5
5- RÉALISATION DES STRUCTURES DRAINANTES SOUS TROTTOIR	5
6- RÉALISATION DES REVÊTEMENTS DE TROTTOIR ET DES ENTRÉES RIVERAINS	10
7- TERRASSEMENT ET EMPIERREMENT DE LA VOIRIE	7
8- MISE EN TERRE DES ESPACES VERTS	2
9- RÉALISATION DES REVÊTEMENTS DE VOIRIE	5
10- TRAVAUX DE FINITIONS - SIGNALISATION DE CHANTIER	5
